

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión del problema administrativo y necesidades del cliente

MINUTA No. 1

Fecha: 25/Agosto/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Reunión virtual usando Teams

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Precisar la situación que el sistema SD Automation atenderá y el resultado esperado por el cliente.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: entrevista y descripción del problema.			
	Captura de las preguntas realizadas al cliente.			
	Evidencia visual del manejo actual mediante archivos de Office y hojas de cálculo.			
Adjuntos:	Entrevista al cliente y descripción del problema en el levantamiento de requisitos.			

Puntos Claves Discutidos:


1	Se revisó que la información administrativa se gestiona en archivos separados, lo que obliga a consultar varias fuentes y puede generar duplicidad, errores de captura y versiones desactualizadas.
2	La necesidad expresada es concentrar los procesos administrativos y operativos en una plataforma web con información vigente y seguimiento de operaciones.

Problemas:

1	La información distribuida dificulta localizar datos y verificar cuál archivo contiene la versión actual.
---	---

Líneas de Acción:

1	Documentar el problema y el resultado esperado en el levantamiento; usar esa descripción como referencia para delimitar requisitos y módulos.
---	---



5. Requisitos pendientes de confirmar con el cliente

ID	Punto pendiente
RP-01	Definir los tipos de usuario, roles y permisos dentro del sistema.
RP-02	Definir los campos obligatorios exactos para clientes, proveedores, productos y demás registros.
RP-03	Confirmar el formato y numeración definitiva de cotizaciones, órdenes de

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Delimitación de procesos y módulos del sistema

MINUTA No. 2

Fecha: 26/Agosto/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Ordenar los procesos administrativos mencionados por el cliente y establecer el alcance funcional que se documentará.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: procesos que requieren incluirse.			
	Capturas de la estructura del proyecto y de los módulos visibles.			
	Fase 2: actividades del proyecto.			
Adjuntos:	Listado de procesos del levantamiento y capturas de módulos en el repositorio SDAUTOMATION.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se identificaron cotizaciones, órdenes de compra, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, hojas de servicio, inventario y un tablero con reportes e indicadores como procesos relacionados.
2	Se revisó la relación entre la consulta de información centralizada y el seguimiento de compras, pagos, cobros, servicios e inventario.

Problemas:

1	La documentación agrupa varios procesos; es necesario evitar que el alcance de cada módulo quede ambiguo o se traslape.
---	---

Líneas de Acción:

1	Mantener un listado único de módulos y vincular cada proceso con los requisitos que lo describen antes de planificar su desarrollo.
---	---

13:02

ControlarChatGente4ParticiparReaccionarVistaAplicaciones

Proyecto Innovación TecnológicaLevantamiento de Requisitos SDA

FileC:/Users/nahom/Downloads/Levantamiento%20de%20Requisitos%20SDAUTOMATION.pdf

YouTubeWhatsAppFacebookusg campus virtualAdobe AcrobatNext.js by VercelReactJale Estudio DigitalmarketingOther favorites

at 11

LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS

Sistema Web Administrativo - SDAUTOMATION

Entrevista de levantamiento y especificación de requisitos

1. Entrevista de levantamiento de requisitos

La siguiente entrevista organiza las necesidades identificadas con SDAUTOMATION en forma de preguntas y respuestas, con el propósito de convertirlas posteriormente en requisitos del sistema. Las respuestas se redactan como síntesis de las necesidades documentadas para el proyecto.

Pregunta realizada al cliente	Respuesta / necesidad identificada
¿Cuál es el principal problema que buscan resolver con el nuevo sistema?	Actualmente gran parte de la información administrativa se maneja mediante archivos de Microsoft Office y hojas de cálculo. Se busca centralizar la información para

EO

JM

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión de encuesta y necesidades de mercado

MINUTA No. 3

Fecha: 27/Agosto/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Usar los resultados visibles de la encuesta como insumo para priorizar necesidades relacionadas con el sistema.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Resultados de Encuesta de Estudio de Mercado (anexos de Fase 2).			
	Captura de resultados sobre tipo de empresa y tiempo de operación.			
	Captura de respuestas sobre procesos y nivel de digitalización.			
Adjuntos:	Gráficas de resultados de la encuesta incluidas en los anexos de Fase 2.			

Puntos Claves Discutidos:


1	Se revisaron respuestas relacionadas con el tipo de empresa, tiempo de operación, información que se consulta y procesos administrativos en los que participan los encuestados.
2	Los gráficos presentan respuestas sobre cotizaciones, compras a proveedores, cuentas por pagar y cobrar, inventario, servicios, reportes y registro de horas trabajadas.

Problemas:

1	Los gráficos compartidos no muestran por sí solos el detalle de cada participante ni permiten generalizar más allá de las respuestas presentadas.
---	---

Líneas de Acción:

1	Conservar las gráficas como evidencia y vincular cada necesidad visible con el módulo correspondiente, sin atribuir resultados no mostrados.
---	--

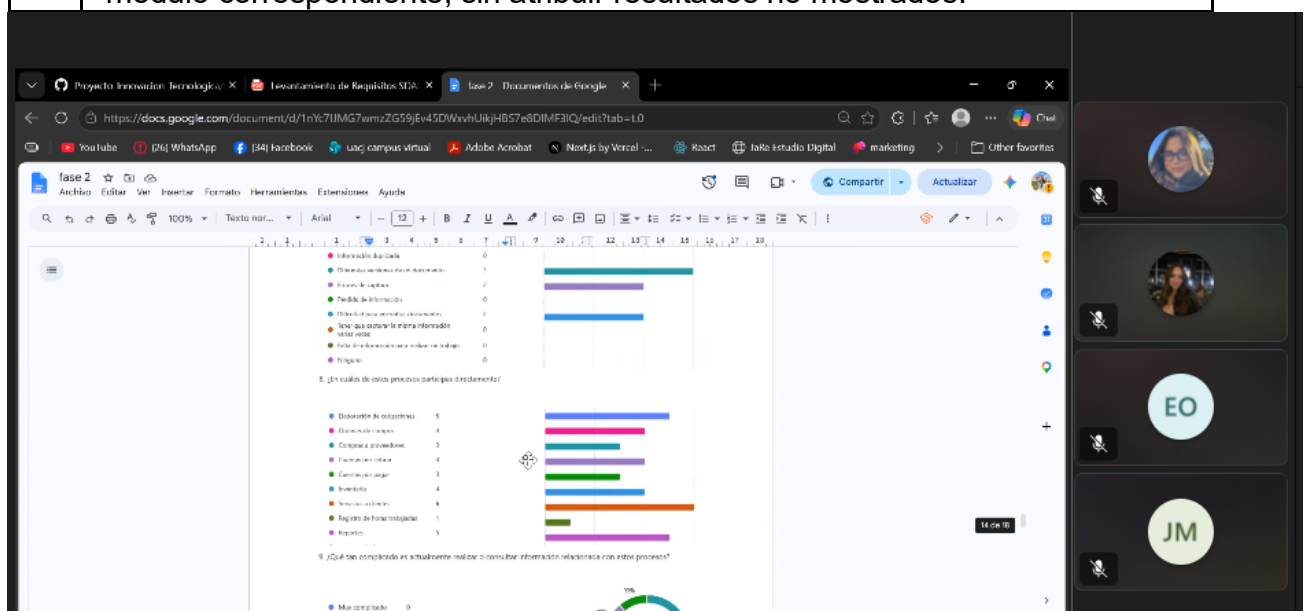

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Definición y revisión de requisitos no funcionales

MINUTA No. 4

Fecha: 1/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Revisar las características generales de operación y calidad planteadas para SD Automation.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: sección de requisitos no funcionales.			
	Captura de RNF-01 y RNF-02 con estado definido.			
	Notas de los criterios técnicos pendientes de confirmación.			
Adjuntos:	Tabla de requisitos no funcionales del levantamiento de requisitos.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se revisaron como requisitos definidos que el sistema funcione como aplicación web y que la interfaz facilite el uso de los procesos administrativos contemplados.
2	El documento señala que aún debe confirmarse un criterio técnico medible para completar las características de operación y calidad.

Problemas:

1	Algunos criterios de calidad no tienen todavía una medida técnica verificable, por lo que podrían interpretarse de distintas maneras.
---	---

Líneas de Acción:

1	Mantener los requisitos definidos y registrar el criterio medible como pendiente de confirmación antes de cerrar la especificación.
---	---

C:\Users\mahom\Downloads\Levantamiento%20de%20Requisitos%20SDAUTOMATION.pdf

YouTube

WhatsApp

Facebook

usc campus virtual

Adobe Acrobat

Next.js by Vercel ...

React

Jala estudio Digital

marketing

Other favorites

Ask Copilot

7 of 10

consultar reportes mensuales y anuales.

3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen características generales de operación y calidad. Cuando el levantamiento actual no define un criterio técnico medible, se señala como pendiente de confirmación para evitar asumir condiciones no acordadas con SDAUTOMATION.

ID	Requisito no funcional	Estado
RNF-01	El sistema deberá funcionar como una aplicación web.	Definido
RNF-02	La interfaz deberá facilitar el uso de los procesos administrativos contemplados en el sistema.	Definido

EO

JM

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Validación de reglas de negocio para inventario y saldos

MINUTA No. 5

Fecha: 2/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Revisar las reglas de negocio documentadas para que las operaciones del sistema respeten el manejo esperado.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: reglas de negocio RN-01 a RN-05.			
	Captura de las reglas de inventario y cuentas por pagar/cobrar.			
	Relación de módulos de compras, servicios e inventario.			
Adjuntos:	Tabla "Reglas de negocio identificadas" del levantamiento de requisitos.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se revisó que el inventario se maneje mediante Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS), y que cada movimiento de entrada o salida quede registrado.
2	Las reglas indican distinguir en cuentas por pagar las obligaciones pendientes de las pagadas; identificar cuentas por cobrar vencidas o próximas a vencer; y considerar horas, precio por hora, refacciones y materiales en hojas de servicio.

Problemas:

1	Una regla sin vínculo claro a su operación podría aplicarse de forma distinta en inventario, saldos o servicios.
---	--

Líneas de Acción:

1	Relacionar cada regla RN con su módulo y con el requisito funcional que la implementará; conservar los identificadores RN-01 a RN-05.
---	---

C:\Users\mahom\Downloads\Levantamiento%20de%20Requisitos%205DAUTOMATION.pdf

YouTube

WhatsApp

Facebook

usg campus virtual

Adobe Acrobat

Next.js by Vercel ...

Koala

Info estudio Digital

marketing

Other favorites

Ask Copilot

9 of 10

ID

4. Reglas de negocio identificadas

ID	Regla de negocio
RN-01	El inventario deberá manejarse bajo el método Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS).
RN-02	Las cuentas por pagar deberán permitir distinguir obligaciones pendientes de las ya pagadas.
RN-03	Las cuentas por cobrar deberán permitir identificar cuentas vencidas o próximas a vencer.
RN-04	Las hojas de servicio deberán considerar las horas trabajadas, el precio por hora y las refacciones o materiales utilizados.
RN-05	Cada entrada o salida de inventario deberá reflejarse en los rubros de cuentas por pagar.

EO

JM

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Organización del trabajo con metodología Scrum

MINUTA No. 6

Fecha: 3/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Alinear la organización del equipo con las actividades Scrum descritas para el desarrollo de SD Automation.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Fase 2: actividades determinadas para cada responsable.			
	Captura de organización de sprints y seguimiento del Product Backlog.			
	Documento de roles y responsabilidades del equipo.			
Adjuntos:	Fase 2, apartado de metodología Scrum, actividades y responsabilidades.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se revisó la propuesta de trabajar por sprints de dos semanas, seleccionar actividades del Product Backlog según prioridad y revisar el avance al cierre de cada sprint.
2	La documentación asigna responsabilidades principales de organización y priorización, seguimiento del equipo, desarrollo backend, desarrollo frontend y pruebas; también prevé colaboración entre integrantes.

Problemas:

1	Si el backlog no se prioriza antes del sprint, el equipo puede iniciar trabajo sin una meta común o dejar actividades sin seguimiento.
---	--

Líneas de Acción:

1	Mantener las responsabilidades documentadas y preparar cada sprint a partir de los elementos priorizados del Product Backlog.
---	---

The screenshot shows a Google Docs document titled "fase 2" with the following content:

1. Actividades determinadas por cada responsable en relación con la metodología seleccionada.

Para el desarrollo del sistema web administrativo para SDAUTOMATION se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el desarrollo de manera incremental mediante sprints, facilitando la distribución de actividades, el seguimiento de avances y la incorporación de cambios o retroalimentación durante el desarrollo.

Se propone trabajar mediante sprints de dos semanas, en los cuales se seleccionarán actividades del Product Backlog de acuerdo con su prioridad. Al finalizar cada sprint se realizarán pruebas y una revisión de las funcionalidades desarrolladas, con el propósito de detectar errores, recibir retroalimentación y determinar las actividades que se realizarán posteriormente.

Debido a que el equipo está conformado por cuatro integrantes, se establecerán responsabilidades principales para facilitar la organización, aunque todos los integrantes podrán colaborar en las diferentes etapas del desarrollo.

Renata Vallejo Estrada – Product Owner / Análisis: será responsable principalmente del levantamiento, organización y priorización de los requerimientos del sistema, así como de mantener actualizado el Product Backlog. También participará en la validación de las funcionalidades desarrolladas y en la recopilación de retroalimentación por parte de SDAUTOMATION.

The Zoom interface on the right shows three participants: a woman with blonde hair, a woman with dark hair, and two avatars labeled "EO" and "JM".

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión de actividades, dependencias y estimaciones

MINUTA No. 7

Fecha: 8/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Analizar la secuencia y las estimaciones de las actividades previstas para la fase de desarrollo.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Fase 2: tabla de actividades y estimaciones PERT.			
	Captura de tareas A a I con predecesoras y tiempos.			
	Listado de actividades de levantamiento, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.			
Adjuntos:	Tabla PERT y listado de actividades de Fase 2.			

Puntos Claves Discutidos:

1	La tabla relaciona actividades con predecesoras y tiempos optimista, probable, pésimo y esperado; entre las tareas visibles están levantamiento de requisitos, priorización del Product Backlog, planificación, diseño, desarrollo y documentación.
2	Se revisó que ciertas actividades dependan de la conclusión de otras, por lo que la planeación debe respetar el orden de la tabla y sus estimaciones.

Problemas:

1	Una modificación en requisitos o diseño puede afectar tareas posteriores que dependen de esas actividades.
---	--

Líneas de Acción:

1	Usar la tabla de estimaciones como referencia de secuencia y revisar las dependencias al actualizar el plan de trabajo.
---	---

The screenshot shows a Google Docs document titled 'fase 2' with a table containing project activities and their dependencies. The table has columns for ID, Actividad, Predecesora, Óptimo, Probable, Pésimo, and Tiempo esperado. The activities listed are A (Levantamiento y definición de requisitos), B (Priorización y organización del Product Backlog), C (Planificación y asignación de sprints), and D (Diseño del sistema). The dependencies are indicated in the 'Predecesora' column: A has no predecessor, B depends on A, C depends on B, and D depends on C. The estimated times are provided for each activity.

ID	Actividad	Predecesora	Óptimo	Probable	Pésimo	Tiempo esperado
A	Levantamiento y definición de requisitos.	-	3	5	8	5
B	Priorización y organización del Product Backlog	A	2	3	5	3
C	Planificación y asignación de sprints	B	2	3	5	3
D	Diseño del sistema	C	8	12	18	12

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión de recursos humanos, tecnológicos y costos

MINUTA No. 8

Fecha: 9/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Confirmar los recursos identificados para desarrollar el sistema y los costos directos reportados.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Fase 2: apartado "Recursos y Costos".			
	Capturas de recursos humanos, herramientas y costos directos.			
	Relación de computadoras, conexión a Internet, Visual Studio Code, GitHub y JIRA.			
Adjuntos:	Tablas de recursos humanos, recursos tecnológicos y costos directos de Fase 2.			

Puntos Claves Discutidos:

1	La documentación considera cuatro integrantes con responsabilidades de análisis, coordinación, desarrollo backend, frontend y pruebas; también menciona computadoras y conexión a Internet para el trabajo.
2	En la tabla de costos directos aparecen en \$0 los equipos, la conexión, las herramientas de desarrollo, GitHub y JIRA, descritos como recursos disponibles o sin costo directo para el equipo.

Problemas:

1	Es importante distinguir entre un recurso disponible y un gasto efectivamente presupuestado para el proyecto.
---	---

Líneas de Acción:

1	Conservar las cantidades y costos reportados en Fase 2 y señalar cualquier cambio de disponibilidad en la planeación.
---	---

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window is a web browser displaying a GitHub repository for 'Proyecto-Innovacion-Tecnologica'. The file 'api.php' is open, showing PHP code for session management and API endpoints. The Zoom interface includes a top bar with icons for 'Controlar', 'Chat', 'Gente', 'Participar', 'Reaccionar', 'Vista', and 'Aplicaciones'. On the right, there is a vertical list of participants with their avatars and names: 'RenataVallejo', 'JM', and others. The bottom of the screen shows the Zoom status bar with the time '10:55' and various icons.

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Herramientas de coordinación y repositorio

MINUTA No. 9

Fecha: 10/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Revisar las herramientas identificadas para organizar actividades y controlar el código del proyecto.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Fase 2: recursos tecnológicos y de software.			
	Captura de GitHub como repositorio y control de versiones.			
	Captura de JIRA para organización y seguimiento de sprints.			
Adjuntos:	Apartado de recursos tecnológicos de Fase 2 y capturas del repositorio/proyecto.			

Puntos Claves Discutidos:


1	GitHub está identificado para control de versiones y almacenamiento del código; JIRA aparece para organizar actividades y dar seguimiento a los sprints.
2	Visual Studio Code se menciona como herramienta de desarrollo; las actividades documentadas abarcan análisis, programación, integración, pruebas y documentación.

Problemas:

1	Si las actividades y el código se gestionan en lugares distintos sin actualización consistente, el avance puede quedar desfasado.
---	---

Líneas de Acción:

1	Usar las herramientas para los propósitos descritos en Fase 2 y mantener alineados el backlog, el seguimiento y los cambios del repositorio.
---	--

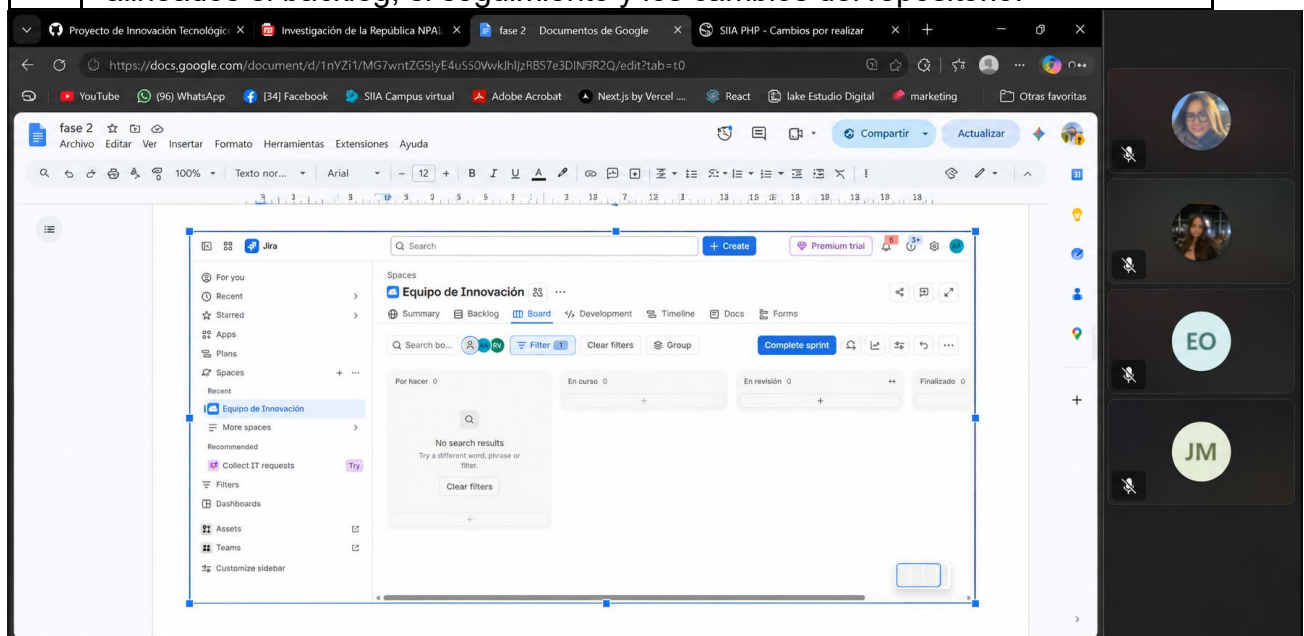

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión de los módulos y sus relaciones

MINUTA No. 10

Fecha: 15/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Asegurar que los módulos identificados respondan a los procesos del cliente y a las reglas de negocio documentadas.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: procesos incluidos.			
	Capturas de los archivos de módulos del repositorio.			
	Reglas RN-01 a RN-05 y requisitos funcionales relacionados.			
Adjuntos:	Captura de archivos del proyecto y listado de procesos del levantamiento.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se relacionaron los procesos de cotizaciones, órdenes de compra, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventario y reportes con sus necesidades de consulta y seguimiento.
2	Las capturas del repositorio muestran archivos asociados a cuentas por cobrar, facturas, inventario y panel principal; se revisó su correspondencia con los procesos documentados.

Problemas:

1	La presencia de archivos por módulo no demuestra por sí sola que todas las reglas y requisitos estén integrados en cada flujo.
---	--

Líneas de Acción:

1	Mantener la trazabilidad entre requisito, regla RN, módulo y evidencia del repositorio al revisar cada avance.
---	--

The screenshot shows a Google Docs interface with a document titled 'fase 2'. The document content includes a table with the following data:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Documentación	H																												

Below the table, the section '4. Recursos y Costos' is visible, followed by a paragraph discussing the development of the SDAUTOMATION system and the resources required.

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión de acceso y pantalla de inicio de sesión

MINUTA No. 11

Fecha: 16/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Examinar la pantalla de acceso visible y relacionarla con el requisito de operación como aplicación web.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Captura de pantalla de inicio de sesión de SD Automation.			
	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: RNF-01, aplicación web.			
	Captura de interfaz del sistema.			
Adjuntos:	Captura compartida de la pantalla de acceso; no se transcriben datos visibles de la cuenta.			

Puntos Claves Discutidos:


1	Se observó una pantalla de inicio de sesión con campos de correo y contraseña y un botón para entrar al sistema.
2	La pantalla sirve como evidencia de una interfaz web de acceso; se revisó su relación con la facilidad de uso planteada para los procesos administrativos.

Problemas:

1	La captura no permite confirmar por sí sola el comportamiento de autenticación, los permisos ni los criterios técnicos de seguridad.
---	--

Líneas de Acción:

1	Registrar la pantalla como evidencia de interfaz y mantener esos comportamientos sujetos a los requisitos que se documenten y verifiquen.
---	---

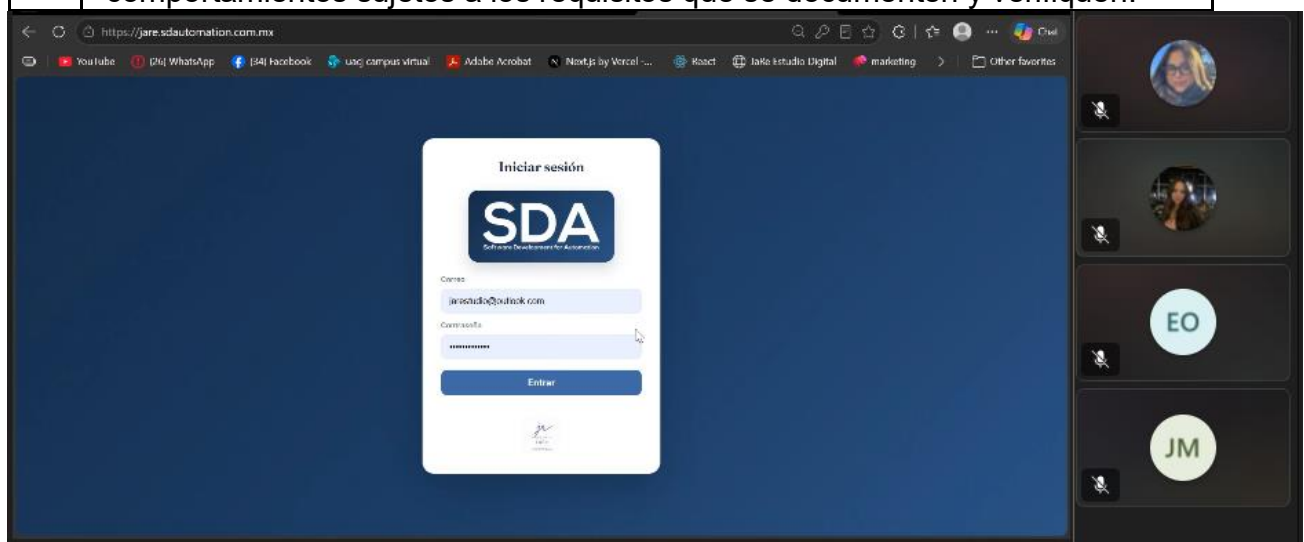

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión del panel de reportes mensuales

MINUTA No. 12

Fecha: 17/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Examinar la información que presenta el panel de reportes y su relación con los procesos administrativos.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Captura del panel "Reportes", periodo mensual de octubre de 2026.			
	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: reportes e indicadores.			
	Capturas de tarjetas resumen y gráficas del panel.			
Adjuntos:	Captura del panel de reportes mensual de octubre de 2026.			

Puntos Claves Discutidos:

1	El panel muestra tarjetas para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, posición neta, utilidad estimada, ventas, compras, cobros y pagos del mes, además de gráficas.
2	En la captura del periodo mensual visible, los valores de las tarjetas aparecen en \$0.00 y se muestran secciones para ventas por día y antigüedad de saldos por cobrar.

Problemas:

1	La imagen corresponde a un estado puntual del panel y no permite concluir si los valores representan datos de operación o una vista sin registros.
---	--

Líneas de Acción:

1	Usar la captura para revisar la organización de reportes e indicadores y validar los valores con los datos del periodo cuando se realice esa comprobación.
---	--

The screenshot shows a Google Docs document titled "fase 2" with a table of expenses. The table has two columns: the item name and the amount. The items listed are "Equipo de cómputo", "Conexión a Internet", "Herramientas de desarrollo", "GitHub", and "JIRA", all with a value of "\$0". The document is open in a browser with several tabs, including "Proyecto Innovación Tecnológica", "Escribiendo de Requisitos SIGA", "fase 2 - Documentos de Google", and "Bolsa de trabajo, ofertas de trabajo". On the right side of the screen, a video call interface is visible with three participants: a woman, a person with initials "EO", and a person with initials "JM".

Item	Amount
Equipo de cómputo	\$0
Conexión a Internet	\$0
Herramientas de desarrollo	\$0
GitHub	\$0
JIRA	\$0

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Correspondencia entre archivos de módulos y requisitos

MINUTA No. 13

Fecha: 22/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Revisar la evidencia del repositorio frente a los procesos identificados en el levantamiento.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Captura del árbol de archivos del proyecto SD Automation.			
	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf.			
	Listado de módulos: cuentas por cobrar, facturas, inventario y panel principal.			
Adjuntos:	Captura del repositorio que muestra archivos de módulos y README.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se observaron archivos con nombres relacionados con cuentas por cobrar, facturas e inventario, así como un archivo de panel principal y un README en el repositorio.
2	Se revisó que los nombres de los módulos visibles correspondan a parte de los procesos identificados; la captura no muestra el comportamiento completo de cada archivo.

Problemas:

1	La estructura de archivos no permite verificar por sí sola que cada requisito esté implementado o conectado a los demás módulos.
---	--

Líneas de Acción:

1	Registrar la estructura como evidencia de organización y completar la revisión funcional contra los requisitos y reglas de negocio.
---	---

The screenshot shows a Google Docs document titled "fase 2" with a table containing project phases. The table has columns for phase letter, description, duration, and two cost values. The video call interface on the right shows four participants: three with profile pictures and one with the initials "JM".

Letra	Descripción	Duración	Costo 1	Costo 2
B	Priorización y organización del Product Backlog	3	\$100	\$300
C	Planificación y asignación de sprints	3	\$100	\$300
D	Diseño del sistema	12	\$100	\$1,200
E	Desarrollo de las funcionalidades	60	\$100	\$6,000
F	Pruebas y validación de las funcionalidades	21	\$100	\$2,100
G	Revisión y retroalimentación	5	\$100	\$500
H	Implementación del sistema	8	\$100	\$800

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Seguimiento de requisitos funcionales y flujos

MINUTA No. 14

Fecha: 23/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Consolidar la relación entre necesidades del cliente, módulos y flujos administrativos descritos.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf: preguntas y procesos.			
	Capturas de encuesta sobre procesos administrativos.			
	Capturas de módulos y panel de reportes.			
Adjuntos:	Entrevista y tablas de procesos del levantamiento; encuesta y capturas de interfaz.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se revisó que la plataforma propuesta concentre información para cotizaciones, compras, pagos, cobros, hojas de servicio, inventario y reportes.
2	Los procesos visibles en la encuesta y en el levantamiento se contrastaron con los módulos y las pantallas capturadas para identificar correspondencias documentales.

Problemas:

1	Las capturas representan partes distintas del proyecto y no detallan todos los pasos ni validaciones de cada flujo.
---	---

Líneas de Acción:

1	Mantener la lista de procesos como base de trazabilidad y documentar cualquier detalle de flujo solo cuando aparezca en el levantamiento o en la evidencia del sistema.
---	---

The screenshot shows a Google Docs document titled "fase 2" with a table containing project tasks. The table has four columns: Task Name, Quantity, Description, and Cost. The tasks listed are:

Task Name	Quantity	Description	Cost
JIRA	1	Organización de actividades y seguimiento de sprints.	\$0
Navegadores web	4	Pruebas y validación del sistema.	\$0
Servidor de SDAUTOMATION	1	Almacenamiento y funcionamiento del sistema web.	\$0*
Cyberduck	1	Conexión y transferencia de archivos hacia el servidor proporcionado por la empresa.	\$0

On the right side of the screenshot, there is a video call interface showing three participants: a person with blonde hair, a person with dark hair, and two circular icons labeled "EO" and "JM".

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión de encuesta y prioridades de módulos

MINUTA No. 15

Fecha: 24/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Releer la evidencia de mercado junto con los módulos documentados para mantener una priorización sustentada.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Gráficas de la encuesta sobre digitalización y procesos participantes.			
	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf.			
	Fase 2: Product Backlog y priorización.			
Adjuntos:	Gráficas de la encuesta y apartado de Product Backlog en Fase 2.			

Puntos Claves Discutidos:


1	Los resultados visibles incluyen respuestas sobre procesos como cotizaciones, compras, cuentas por pagar y cobrar, inventario, servicios, registro de horas y reportes.
2	Se vinculó esta evidencia con el uso del Product Backlog descrito en Fase 2, donde las actividades del sprint se seleccionan según su prioridad.

Problemas:

1	Las imágenes no aportan una ponderación completa de prioridad para cada módulo; no debe inferirse un orden definitivo a partir de las gráficas parciales.
---	---

Líneas de Acción:

1	Conservar la encuesta como contexto de necesidades y definir el orden de trabajo mediante el Product Backlog documentado.
---	---

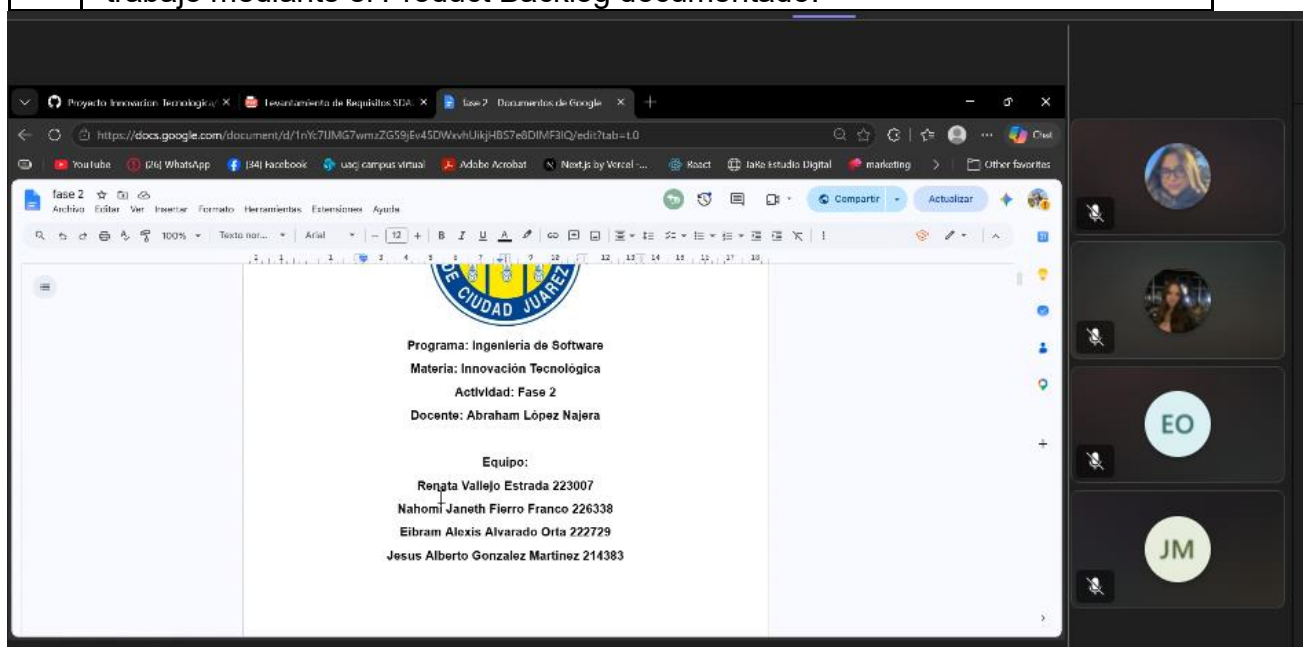

The screenshot shows a Google Docs interface with a document titled 'Fase 2'. The document content includes the following text:

Programa: Ingeniería de Software
Materia: Innovación Tecnológica
Actividad: Fase 2
Docente: Abraham López Najera

Equipo:

- Rengta Vallejo Estrada 223007
- Nahomi Janeth Fierro Franco 226338
- Eibram Alexis Alvarado Orta 222729
- Jesus Alberto Gonzalez Martinez 214383

The document is viewed in a browser window with multiple tabs open. On the right side of the screen, there is a vertical sidebar containing profile pictures of participants and circular icons labeled 'EO' and 'JM'.

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Seguimiento de criterios de calidad y trazabilidad

MINUTA No. 16

Fecha: 29/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Revisar pendientes de especificación y asegurar que los cambios sigan vinculados con la evidencia disponible.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Tabla de requisitos no funcionales del levantamiento.			
	Reglas de negocio RN-01 a RN-05.			
	Capturas de interfaz, panel y archivos del proyecto.			
Adjuntos:	Levantamiento de requisitos y capturas del repositorio e interfaces.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se repasaron los requisitos web y de facilidad de uso, así como las reglas de inventario, cuentas por pagar/cobrar y hojas de servicio.
2	Se relacionaron estos elementos con las pantallas y archivos visibles, manteniendo como pendiente la confirmación de criterios técnicos medibles señalada en el documento.

Problemas:

1	La evidencia visual no sustituye la definición ni la verificación de criterios técnicos que el levantamiento marca como pendientes.
---	---

Líneas de Acción:

1	Actualizar la trazabilidad al cambiar requisitos y conservar identificados los criterios cuya confirmación sigue abierta.
---	---

The screenshot displays a web application interface. On the left, a file explorer shows a directory structure with files like 'Encuesta Es...', 'Levantamiento de Requisitos SD...', 'README.md', 'api.php', 'cuentas_cobrar.html', 'facturas_xml.html', 'index.html', and 'inventario.html'. The main area shows a document titled 'Proyecto-Innovacion-Tecnologica / Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf'. The document content includes a table with two columns: 'Pregunta realizada al cliente' and 'Respuesta / necesidad identificada'. The table has two rows of data. The right sidebar shows a list of user avatars, including one labeled 'EO' and another labeled 'JM'.

Pregunta realizada al cliente	Respuesta / necesidad identificada
¿Cuál es el principal problema que buscan resolver con el nuevo sistema?	Actualmente gran parte de la información administrativa se maneja mediante archivos de Microsoft Office y hojas de cálculo. Se busca centralizar la información para reducir errores de captura, documentos duplicados, versiones desactualizadas y tiempo invertido en consultar diferentes archivos.
¿Qué esperan obtener con el sistema?	Una plataforma web que concentre los principales procesos administrativos y operativos de la empresa, permita consultar información actualizada y facilite el

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Revisión del plan de actividades y responsabilidades

MINUTA No. 17

Fecha: 30/Septiembre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Repasar la organización del equipo, las dependencias de actividades y el seguimiento previsto para los sprints.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Fase 2: responsabilidades del equipo y metodología Scrum.			
	Tabla PERT de actividades y predecesoras.			
	Captura de seguimiento del Product Backlog y sprints.			
Adjuntos:	Fase 2: Scrum, responsables, tabla de actividades y estimaciones.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se revisaron las responsabilidades principales asignadas al equipo y la secuencia de actividades de levantamiento, priorización, planificación, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.
2	La propuesta documentada contempla sprints de dos semanas y revisión del avance al cierre; la tabla PERT aporta tiempos esperados y predecesoras para la planeación.

Problemas:

1	La duración estimada de las tareas depende de sus predecesoras y puede verse afectada si cambian requisitos o prioridades.
---	--

Líneas de Acción:

1	Mantener la secuencia PERT y el backlog como referencias complementarias al preparar y revisar cada sprint.
---	---

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting in progress. The main window displays a Google Docs document titled "fase 2" which contains a PERT table. The table lists resources and their activities:

Recurso humano	Cantidad	Actividades principales
Product Owner / Analista	1	Levantamiento de requerimientos, priorización de actividades, administración del Product Backlog y validación de funcionalidades.
Sprint Master / Coordinación	1	Organización de sprints, seguimiento de actividades en JIRA, coordinación del equipo e identificación de retrasos o bloqueos.
Desarrollo Backend	1	Desarrollo de la lógica del sistema, base de datos, reglas de negocio e integración entre módulos.
Desarrollo Frontend y Pruebas	1	Desarrollo de interfaces, integración de funcionalidades, pruebas funcionales y registro de errores.
Total	4	Equipo encargado del análisis, diseño,

The Teams interface includes a sidebar with navigation options like Soporte, Chat, Equipos, Tareas, Asistencia, Calendario, and Tienda. The top bar shows the time as 06:18 and various meeting controls. The bottom right corner shows a list of participants, including one with the initials JM.

Administración de Proyectos

Nombre de reunión: Cierre de revisión documental del avance de SD Automation

MINUTA No. 18

Fecha: 1/Octubre/2026

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

**Lugar: Reunión virtual usando
Teams**

Convocada por:	Nahomi Fierro			
Propósito de la reunión:	Consolidar los temas revisados y dejar líneas de seguimiento basadas en los documentos y capturas disponibles.			
Asistentes:	Nahomi Fierro	Renata Vallejo	Eibram Alvarado	Jesus Gonzalez
Documentos de la reunión:	Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf.			
	Fase 2: actividades, Scrum, recursos y costos.			
	Capturas de encuesta, repositorio, acceso y panel de reportes.			
Adjuntos:	Documentos de levantamiento y Fase 2; capturas proporcionadas como base temática.			

Puntos Claves Discutidos:

1	Se integraron las necesidades del cliente, los procesos y módulos, los requisitos no funcionales, las reglas de negocio y la evidencia visual de interfaz y repositorio.
2	También se repasaron la encuesta, las estimaciones de actividades, las responsabilidades Scrum y los recursos y costos reportados para el proyecto.

Problemas:

1	La evidencia consultada cubre distintos componentes y no permite afirmar por sí sola que todos los módulos estén terminados o validados.
---	--

Líneas de Acción:

1	Continuar la documentación con trazabilidad entre requisitos, reglas, módulos y evidencia; mantener pendientes explícitos los criterios técnicos aún no confirmados.
---	--

08:24

ControlarChatGenteParticiparReaccionarVistaAplicaciones

FilesamAlvarado222729/Proyecto-Innovacion-Tecnologica

Issue 2 · Documentos de Google

https://github.com/EibramAlvarado222729/Proyecto-Innovacion-Tecnologica/blob/main/Levantamiento%20de%20Requisitos%20SDAUTOMATIO...

YouTubeWhatsAppFacebookusq campus virtualAdobe AcrobatNext.js by Vercel...ReactJato studio DigitalmarketingOther favorites

<> CodeIssuesPull requestsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Proyecto-Innovacion-TecnologicaPublic

Watch0Fork0Star0

main1 Branch0 Tags

Go to file

Code

AL226338Resuestas_Estudio_de_mercado418B12 · 21 minutos ago · 4 Commits

Encuesta Estudio de mercado de Sistemas Ad...Resuestas_Estudio_de_mercado27 minutes ago

Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATIO...Add files via upload1 hour ago

README.mindInitial commit2 hours ago

api.phpAdd files via upload1 hour ago

cuentas_cobrar.htmlAdd files via upload1 hour ago

facturas_xml.htmlAdd files via upload1 hour ago

index.htmlAdd files via upload1 hour ago

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

Create a new release

https://github.com/EibramAlvarado222729/Proyecto-Innovacion-Tecnologica/blob/main/Levantamiento de Requisitos SDAUTOMATION.pdf
