

**Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)**

**Instituto de Ingeniería y Tecnología**



**Programa: Ingeniería de Software**

**Materia: Innovación Tecnológica**

**Actividad: Fase 2**

**Docente: Abraham López Najera**

**Equipo:**

**Renata Vallejo Estrada 223007**

**Nahomi Janeth Fierro Franco 226338**

**Eibram Alexis Alvarado Orta 222729**

**Jesus Alberto Gonzalez Martinez 214383**

## **Índice**

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Actividades determinadas por cada responsable en relación con la metodología seleccionada.       | 3  |
| 2. Análisis situación actual respecto al servicio o producto a mejorar o implementar análisis foda. | 4  |
| 3. Plan de Trabajo                                                                                  | 6  |
| 4. Recursos y Costos                                                                                | 7  |
| 5. Actividades desarrolladas que contemplaran para la fase 2 github                                 | 12 |
| 6. Resultados Encuesta de estudio Mercado (ANEXOS)                                                  | 12 |

## **1. Actividades determinadas por cada responsable en relación con la metodología seleccionada.**

Para el desarrollo del sistema web administrativo para SDAUTOMATION se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el desarrollo de manera incremental mediante sprints, facilitando la distribución de actividades, el seguimiento de avances y la incorporación de cambios o retroalimentación durante el desarrollo.

Se propone trabajar mediante sprints de dos semanas, en los cuales se seleccionarán actividades del Product Backlog de acuerdo con su prioridad. Al finalizar cada sprint se realizarán pruebas y una revisión de las funcionalidades desarrolladas, con el propósito de detectar errores, recibir retroalimentación y determinar las actividades que se realizarán posteriormente.

Debido a que el equipo está conformado por cuatro integrantes, se establecerán responsabilidades principales para facilitar la organización, aunque todos los integrantes podrán colaborar en las diferentes etapas del desarrollo.

Renata Vallejo Estrada – Product Owner / Análisis: será responsable principalmente del levantamiento, organización y priorización de los requerimientos del sistema, así como de mantener actualizado el Product Backlog. También participará en la validación de las funcionalidades desarrolladas y en la recopilación de retroalimentación por parte de SDAUTOMATION.

Nahomi Janeth Fierro Franco – Scrum Master / Coordinación: será responsable de apoyar en la organización de los sprints, registrar y dar seguimiento a las actividades mediante JIRA, verificar el avance de las tareas e identificar posibles problemas o retrasos que puedan afectar el desarrollo.

Eibram Alexis Alvarado Orta – Desarrollo Backend: tendrá como responsabilidad principal el desarrollo de la lógica del sistema, manejo de la base de datos, reglas de negocio e integración de la información entre los diferentes módulos administrativos.

Jesús Alberto González Martínez – Desarrollo Frontend y Pruebas: será responsable principalmente del desarrollo e integración de las interfaces del sistema, además de participar en las pruebas funcionales para verificar que los módulos funcionen correctamente y registrar los errores encontrados para su corrección.

Durante cada sprint los integrantes colaborarán en las actividades necesarias de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, manteniendo las responsabilidades anteriores como una forma de organizar y dar seguimiento al trabajo del equipo.

## **2. Análisis situación actual respecto al servicio o producto a mejorar o implementar análisis foda.**

La empresa SD Automation se dedica a la automatización industrial, desarrollando e integrando soluciones relacionadas con PLC, robots, controles y sistemas de automatización, con el objetivo de apoyar y mejorar los procesos de manufactura de sus clientes. Debido al crecimiento de sus operaciones, la empresa ha pasado de contar inicialmente con dos colaboradores a trabajar actualmente con cuatro personas, además de apoyarse en personal subcontratado para atender determinados proyectos y actividades.

Este crecimiento ha generado la necesidad de mejorar la forma en que se administran y controlan las operaciones internas. Actualmente, gran parte de la información administrativa se gestiona mediante Microsoft Office y archivos compartidos, principalmente hojas de cálculo. Aunque esta herramienta ha permitido llevar un control básico de las actividades, el incremento en el volumen de información ha hecho más evidente algunas limitaciones del método actual.

Uno de los principales problemas identificados es el manejo manual de la información. Al existir diferentes archivos y documentos que pueden ser modificados por distintos usuarios, se han presentado situaciones en las que existen varias versiones de un mismo documento, información desactualizada o errores derivados de la captura manual. Esto dificulta identificar cuál es la versión más reciente y confiable de la información.

En el área de cuentas por pagar y control de proveedores, también se han identificado áreas de oportunidad. El registro manual de fechas, montos y vencimientos puede generar errores de captura, ocasionando que una factura sea identificada incorrectamente como vencida o que existan diferencias entre el importe registrado, la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. Estas inconsistencias pueden dificultar el seguimiento de las obligaciones de pago y la toma de decisiones financieras.

Otro proceso que presenta oportunidades de mejora es el control de inventario. La empresa cuenta con materiales y componentes utilizados en sus proyectos de automatización; sin embargo, los inventarios y conteos se realizan principalmente mediante hojas de Excel. Este procedimiento requiere mayor intervención manual y dificulta conocer de manera inmediata las existencias disponibles, los movimientos realizados y el estado actual de los materiales.

Aunado a lo anterior, debido al crecimiento de la empresa existe interés en contar con dashboards e indicadores en tiempo real que permitan visualizar información relevante de la operación. Actualmente, obtener este tipo de información requiere revisar y consolidar diferentes archivos, lo que incrementa el tiempo necesario para generar reportes y limita la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Por lo anterior, se identifica lo siguiente.

| <b>Fortalezas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Oportunidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia en automatización industrial y soluciones para manufactura.</li> <li>• Capacidad para integrar PLC, robots, controles y sistemas industriales.</li> <li>• Crecimiento de la empresa y aumento de personal.</li> <li>• Conocimiento técnico especializado del personal.</li> <li>• Uso actual de herramientas digitales como Microsoft Office.</li> <li>• Capacidad para trabajar con personal interno y subcontratado.</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar un sistema administrativo centralizado.</li> <li>• Automatizar procesos administrativos y financieros.</li> <li>• Implementar dashboards para visualizar indicadores en tiempo real.</li> <li>• Mejorar el control de inventarios y materiales.</li> <li>• Integrar información de compras, proveedores, pagos e inventario.</li> <li>• Reducir errores derivados de la captura manual y duplicidad de documentos.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Debilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Amenazas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependencia de archivos de Excel y herramientas de Office para procesos administrativos.</li> <li>• Existencia de diferentes versiones de un mismo documento.</li> <li>• Errores de captura en fechas, montos y registros de proveedores.</li> <li>• Dificultad para comparar órdenes de compra con facturas y pagos.</li> <li>• Control de inventario principalmente mediante hojas de cálculo.</li> <li>• Información distribuida en diferentes archivos.</li> <li>• La generación de reportes requiere revisión y consolidación manual.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El crecimiento de operaciones puede incrementar los errores si se mantiene el control manual.</li> <li>• Pérdida o desactualización de información importante.</li> <li>• Retrasos o errores en pagos a proveedores.</li> <li>• Incremento de costos por compras o pagos incorrectos.</li> <li>• Falta de materiales necesarios para proyectos por información desactualizada.</li> <li>• Dificultad para tomar decisiones oportunas por falta de información consolidada.</li> <li>• El aumento de personal puede hacer más difícil mantener un control uniforme de la información.</li> </ul> |

### 3. Plan de Trabajo

| <b>ID</b> | <b>Actividad</b> | <b>Predecesora</b> | <b>Óptimo</b> | <b>Probable</b> | <b>Pésimo</b> | <b>Tiempo esperado</b> |
|-----------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|
|-----------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|

|   |                                                 |   |    |    |     |    |
|---|-------------------------------------------------|---|----|----|-----|----|
| A | Levantamiento y definición de requisitos.       | - | 3  | 5  | 8   | 5  |
| B | Priorización y organización del Product Backlog | A | 2  | 3  | 5   | 3  |
| C | Planificación y asignación de sprints           | B | 2  | 3  | 5   | 3  |
| D | Diseño del sistema                              | C | 8  | 12 | 18  | 12 |
| E | Desarrollo de las funcionalidades               | D | 60 | 80 | 120 | 83 |
| F | Pruebas y validación de las funcionalidades     | E | 15 | 20 | 30  | 21 |
| G | Revisión y retroalimentación                    | F | 3  | 5  | 8   | 5  |
| H | Implementación del sistema                      | G | 5  | 8  | 12  | 8  |
| I | Documentación                                   | H | 8  | 12 | 18  | 12 |

## Jira:

<https://jesus1gonzalez.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog>

### 4. Recursos y Costos

Para el desarrollo del sistema administrativo de SDAUTOMATION será necesario considerar los recursos humanos, tecnológicos y de software que permitan realizar las actividades de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación del sistema. Debido a que se trata de un proyecto académico desarrollado por los integrantes del equipo, algunos de los recursos necesarios ya se encuentran disponibles, por lo que no representan un gasto directo durante el desarrollo.

## Recursos humanos

El principal recurso humano está conformado por los cuatro integrantes del equipo de desarrollo. Cada integrante tendrá responsabilidades específicas de acuerdo con la metodología Scrum seleccionada, participando en las diferentes etapas del proyecto, desde el análisis de requerimientos hasta las pruebas e implementación.

| <b>Recurso humano</b>         | <b>Cantidad</b> | <b>Actividades principales</b>                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner / Analista      | 1               | Levantamiento de requerimientos, priorización de actividades, administración del Product Backlog y validación de funcionalidades. |
| Scrum Master / Coordinación   | 1               | Organización de sprints, seguimiento de actividades en JIRA, coordinación del equipo e identificación de retrasos o bloqueos.     |
| Desarrollo Backend            | 1               | Desarrollo de la lógica del sistema, base de datos, reglas de negocio e integración entre módulos.                                |
| Desarrollo Frontend y Pruebas | 1               | Desarrollo de interfaces, integración de funcionalidades, pruebas funcionales y registro de errores.                              |
| <b>Total</b>                  | <b>4</b>        | <b>Equipo encargado del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.</b>                                   |

Aunque se establecen responsabilidades principales, los integrantes podrán colaborar en diferentes actividades de acuerdo con las necesidades de cada sprint.

## Recursos tecnológicos y de software

Para desarrollar el sistema será necesario utilizar equipo de cómputo, conexión a Internet y diferentes herramientas de software que permitan programar, almacenar

el código, administrar las actividades y realizar pruebas. Adicionalmente, **SDAUTOMATION proporcionó al equipo acceso a su infraestructura tecnológica**, incluyendo acceso al servidor de la empresa, utilizando Cyberduck para la conexión y transferencia de archivos, así como un usuario para la administración de la base de datos mediante phpMyAdmin. Por esta razón, estos recursos no representan un costo directo para el equipo de desarrollo.

| <b>Recurso</b>           | <b>Cantidad</b> | <b>Uso dentro del proyecto</b>                        | <b>Costo directo</b> |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Computadoras personales  | 4               | Desarrollo, diseño, pruebas y documentación.          | \$0                  |
| Conexión a Internet      | 4               | Acceso a herramientas, repositorios y comunicación.   | \$0                  |
| Visual Studio Code       | 4               | Desarrollo y edición del código.                      | \$0                  |
| GitHub                   | 1 repositorio   | Control de versiones y almacenamiento del código.     | \$0                  |
| JIRA                     | 1 proyecto      | Organización de actividades y seguimiento de sprints. | \$0                  |
| Navegadores web          | 4               | Pruebas y validación del sistema.                     | \$0                  |
| Servidor de SDAUTOMATION | 1               | Alojamiento y funcionamiento del sistema web.         | \$0*                 |

|               |          |                                                                                      |      |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cyberduck     | 1        | Conexión y transferencia de archivos hacia el servidor proporcionado por la empresa. | \$0  |
| Base de datos | 1        | Almacenamiento centralizado de la información utilizada por el sistema.              | \$0* |
| phpMyAdmin    | 1 acceso | Administración y gestión de la base de datos proporcionada por la empresa.           | \$0* |

**\* Recurso proporcionado por SDAUTOMATION, por lo que no representa un costo directo para el equipo de desarrollo.**

#### Costos directos del proyecto

Debido a que el proyecto se desarrolla con fines académicos y gran parte de los recursos necesarios ya se encuentran disponibles, los costos directos para el equipo son mínimos. SDAUTOMATION proporciona el acceso al servidor y a la base de datos utilizada por el sistema, mientras que los integrantes aportan sus propios equipos de cómputo y conexión a Internet.

| Concepto                   | Costo directo |
|----------------------------|---------------|
| Equipo de cómputo          | \$0           |
| Conexión a Internet        | \$0           |
| Herramientas de desarrollo | \$0           |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| GitHub                                       | \$0        |
| JIRA                                         | \$0        |
| Cyberduck                                    | \$0        |
| Servidor proporcionado por SDAUTOMATION      | \$0        |
| Base de datos proporcionada por SDAUTOMATION | \$0        |
| phpMyAdmin                                   | \$0        |
| Mano de obra del equipo                      | \$0*       |
| <b>TOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>              | <b>\$0</b> |

**\* La mano de obra no representa un desembolso real debido a que el sistema se desarrolla como parte de un proyecto académico.**

#### Costo estimado de desarrollo

Aunque el desarrollo del proyecto no representa un pago real para los integrantes del equipo, se realizó una estimación del valor del trabajo tomando como referencia los tiempos esperados establecidos en el Plan de Trabajo. Para este cálculo se considera un costo de referencia de \$100 MXN por hora de trabajo, tomando en cuenta que se trata de un proyecto académico desarrollado por estudiantes.

**Costo estimado = Tiempo esperado × \$100 MXN por hora**

| ID           | Actividad                                          | Tiempo<br>esperado (h) | Costo<br>por hora | Costo<br>estimado       |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| A            | Levantamiento y definición<br>de requisitos        | 5                      | \$100             | \$500                   |
| B            | Priorización y organización<br>del Product Backlog | 3                      | \$100             | \$300                   |
| C            | Planificación y asignación de<br>sprints           | 3                      | \$100             | \$300                   |
| D            | Diseño del sistema                                 | 12                     | \$100             | \$1,200                 |
| E            | Desarrollo de las<br>funcionalidades               | 83                     | \$100             | \$8,300                 |
| F            | Pruebas y validación de las<br>funcionalidades     | 21                     | \$100             | \$2,100                 |
| G            | Revisión y retroalimentación                       | 5                      | \$100             | \$500                   |
| H            | Implementación del sistema                         | 8                      | \$100             | \$800                   |
| I            | Documentación                                      | 12                     | \$100             | \$1,200                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>Proyecto completo</b>                           | <b>152 h</b>           |                   | <b>\$15,200<br/>MXN</b> |


De acuerdo con las horas esperadas establecidas en el Plan de Trabajo, el costo calculado del desarrollo es de **\$15,200 MXN**. Para efectos de presupuesto y considerando que se trata de una estimación académica, se establece un **costo aproximado del proyecto de \$15,000 MXN**. Esta cantidad representa el valor estimado del trabajo realizado y no un desembolso directo por parte de SDAUTOMATION, ya que el desarrollo es realizado por los integrantes del equipo y la empresa proporciona recursos de infraestructura como el servidor y el acceso a la base de datos.

## 5. Actividades desarrolladas que contemplaran para la fase 2 github

## 6. Resultados Encuesta de estudio Mercado (ANEXOS)


1. ¿A qué tipo de empresa pertenece?

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ● Automatización industrial | 4 |
| ● Manufactura               | 0 |
| ● Servicios técnicos        | 0 |
| ● Comercio                  | 0 |
| ● Construcción              | 0 |
| ● Tecnología / Software     | 3 |
| ● Proveedor                 | 2 |
| ● Otras                     | 0 |

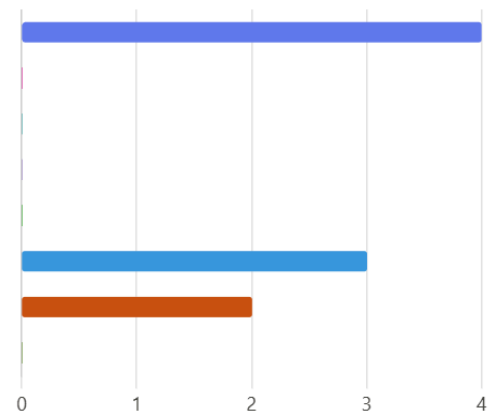


2. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en tu empresa?

|                    |   |
|--------------------|---|
| ● Menos de 6 meses | 0 |
| ● 6 meses a 1 año  | 3 |
| ● 1-3 años         | 3 |
| ● 4-5 años         | 2 |
| ● mas de 5 años    | 1 |




3. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan en tu empresa?

|           |   |
|-----------|---|
| 1-5       | 3 |
| 6-10      | 1 |
| 11-20     | 3 |
| 21-50     | 1 |
| mas de 50 | 1 |




4. ¿Qué herramientas utilizas para realizar tus actividades laborales?

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Excel                               | 8 |
| Word                                | 5 |
| Google Sheets / Drive               | 3 |
| Correo electrónico                  | 7 |
| Sistema administrativo / ERP        | 2 |
| Sistema desarrollado por la empresa | 4 |
| Formatos impresos                   | 1 |
| Otras                               | 0 |

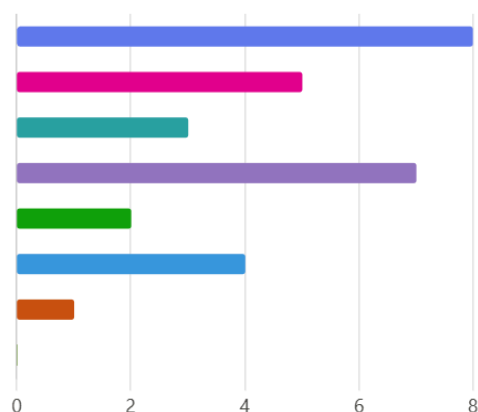


5. ¿Con qué frecuencia tienes que capturar manualmente información en Excel u otros documentos?

|                |   |
|----------------|---|
| Nunca          | 0 |
| Rara vez       | 1 |
| Algunas veces  | 4 |
| Frecuentemente | 2 |
| Todos los días | 2 |

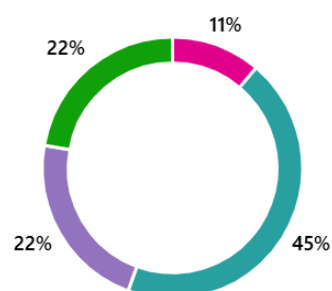


6. ¿Has tenido problemas por utilizar archivos compartidos o diferentes versiones de un mismo documento?

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sí, frecuentemente              | 0 |
| Sí, algunas veces               | 4 |
| Rara vez                        | 4 |
| Nunca                           | 1 |
| No utilizo archivos compartidos | 0 |

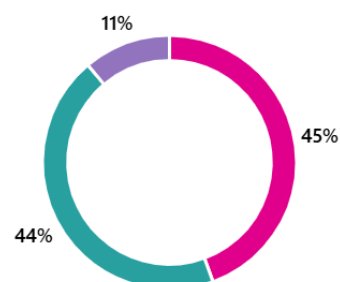


7. ¿Qué problemas has experimentado al administrar información?

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| ● Información desactualizada                           | 2 |
| ● Información duplicada                                | 0 |
| ● Diferentes versiones de un documento                 | 3 |
| ● Errores de captura                                   | 2 |
| ● Pérdida de información                               | 0 |
| ● Dificultad para encontrar documentos                 | 2 |
| ● Tener que capturar la misma información varias veces | 0 |
| ● Falta de información para realizar mi trabajo        | 0 |
| ● Ninguno                                              | 0 |

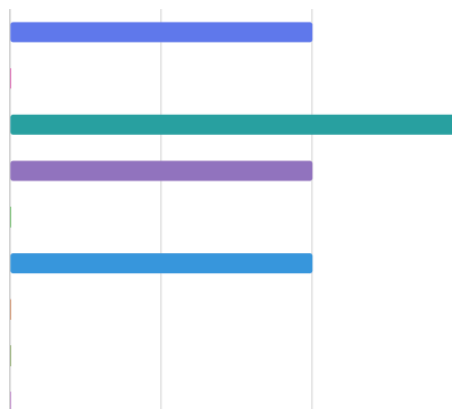


8. ¿En cuáles de estos procesos participas directamente?

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ● Elaboración de cotizaciones  | 5 |
| ● Órdenes de compra            | 4 |
| ● Compras a proveedores        | 3 |
| ● Cuentas por cobrar           | 4 |
| ● Cuentas por pagar            | 3 |
| ● Inventario                   | 4 |
| ● Servicios a clientes         | 6 |
| ● Registro de horas trabajadas | 1 |
| ● Reportes                     | 5 |

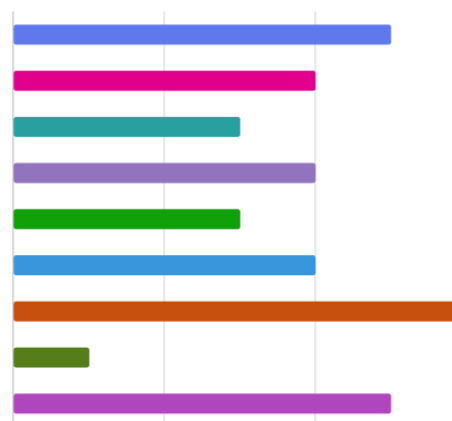


9. ¿Qué tan complicado es actualmente realizar o consultar información relacionada con estos procesos?

|                  |   |
|------------------|---|
| ● Muy complicado | 0 |
| ● Complicado     | 0 |
| ● Regular        | 7 |
| ● Fácil          | 1 |
| ● Muy fácil      | 1 |

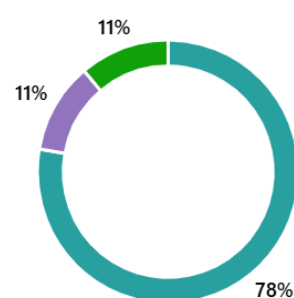


10. ¿Qué tan importante consideras que la información esté actualizada y disponible para las personas autorizadas?

|                 |   |
|-----------------|---|
| Muy importante  | 7 |
| Importante      | 2 |
| Poco importante | 0 |
| Nada importante | 0 |

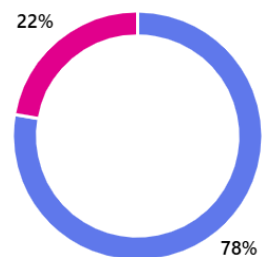

11. ¿Qué tan útil sería contar con dashboards o indicadores que muestren información actualizada de la empresa?

|                    |   |
|--------------------|---|
| Muy útil           | 7 |
| Útil               | 1 |
| Moderadamente útil | 1 |
| Poco útil          | 0 |
| Nada útil          | 0 |

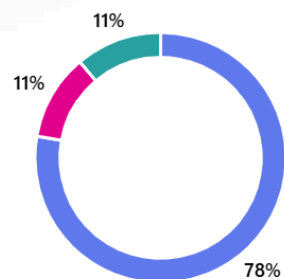

12. ¿Qué tan útil sería para tu trabajo los siguientes módulos?

● Muy útil  
 ● Útil  
 ● Moderadamente útil  
 ● Poco útil  
 ● Nada útil

Cotizaciones



Ordenes de Compra



Cuentas por Cobrar



Cuentas por pagar




Reporte de servicios



Inventario




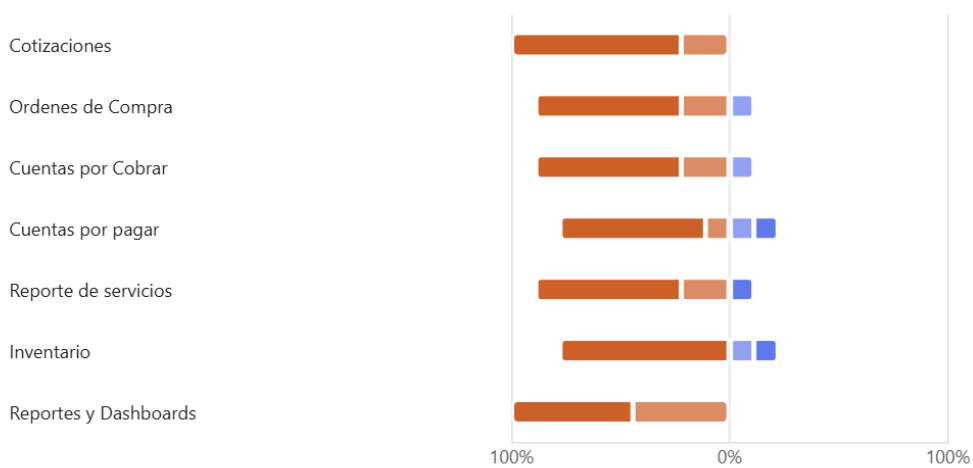

13. Si tu empresa implementara un sistema que integrara estas funciones, ¿consideras que facilitaría tu trabajo?




14. ¿Qué beneficios esperarías obtener de un sistema de este tipo?

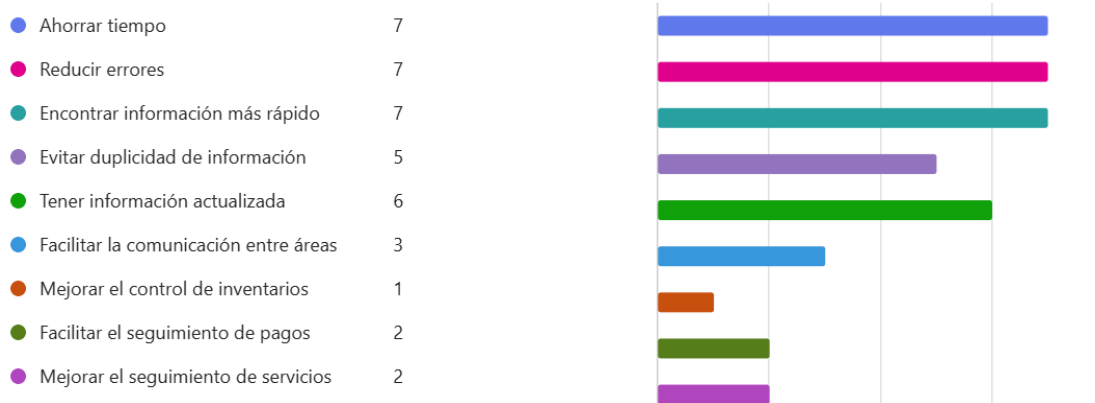

15. ¿Consideras que tu empresa debería implementar un sistema para centralizar y automatizar sus procesos administrati vos?

|                      |   |
|----------------------|---|
| ● Sí                 | 7 |
| ● Probablemente sí   | 0 |
| ● No estoy seguro(a) | 2 |
| ● Probablemente no   | 0 |
| ● No                 | 0 |



16. ¿Qué proceso de tu trabajo consideras que podría mejorarse mediante un sistema administrativo? [Más detalles](#)

9  
Respuestas

Respuestas más recientes  
"Cotizaciones"  
"Actualización de costos de material"  
"Sistema de facturación y órdenes de compra Sistema de administración de d..."  
...

| ID ↑ | Nombre    | Respuestas                                                                                                                          |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | anonymous | cotizaciones                                                                                                                        |
| 2    | anonymous | En las cuentas por pagar                                                                                                            |
| 3    | anonymous | Definitivamente lo de las cotizaciones oara que se hagan a tiempo                                                                   |
| 4    | anonymous | Algo que sea más rápido para mandar las órdenes de compra como que ya tengamos los proveedores dados de alta y sea ya no más llenar |
| 5    | anonymous | Podría mejorar el control y seguimiento de inventarios                                                                              |
| 6    | anonymous | Cotizaciones                                                                                                                        |
| 7    | anonymous | Sistema de facturación y órdenes de compra Sistema de administración de datos (certificados del equipo)                             |
| 8    | anonymous | Actualización de costos de material                                                                                                 |
| 9    | anonymous | Cotizaciones                                                                                                                        |

17. ¿Qué función te gustaría que tuviera un sistema administrativo para facilitar tus actividades laborales? [Más detalles](#)

9  
Respuestas

Respuestas más recientes  
"Que se puedan hacer cotización por horas trabajadas"  
"Información más clara al buscar inventario"  
"Un acceso a la nube para que consultara sus certificados"  
...

17. ¿Qué función te gustaría que tuviera un sistema administrativo para facilitar tus actividades laborales?

9 Respuestas

| ID ↑ | Nombre    | Respuestas                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | anonymous | CRM                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    | anonymous | Que leyera XML                                                                                                                                                                                                                     |
| 3    | anonymous | Yo con lo que más batallo son las cotizaciones de que tardan años en mandarlas entonces traigo al cliente tras de mi                                                                                                               |
| 4    | anonymous | Inventario , cuentas por cobrar , cuentas por pagar                                                                                                                                                                                |
| 5    | anonymous | Necesitaría funciones para registrar entradas y salidas de productos, controlar el inventario, consultar existencias en tiempo real, generar reportes, recibir alertas cuando haya poco stock y llevar un historial de movimientos |
| 6    | anonymous | Acceso desde la nube                                                                                                                                                                                                               |
| 7    | anonymous | Un acceso a la nube para que consultara sus certificados                                                                                                                                                                           |
| 8    | anonymous | Información más clara al buscar inventario                                                                                                                                                                                         |
| 9    | anonymous | Que se puedan hacer cotización por horas trabajadas                                                                                                                                                                                |

18. ¿Qué probabilidad hay de que en su empresa cambien a un sistema administrativo?

[Más detalles](#)



## Link de Github

<https://github.com/EibramAlvarado222729/Proyecto-Innovacion-Tecnologica.git>
